Activity ID	Start	Finish	Work Days	Total Float
Winding Facility incl autoclave - Chrzanow				
186	09JUN04	23JUL04	32	-10
187	26JUL04	30JUL04	5	-10
188		30JUL04*	0	-10
1407-098	01DEC03A	15JUN04	142*	22
1407-100	01DEC03A	30JUL04	174*	-10
1407-110	01MAY04A	27JUL04	61*	-7
1407-115	01MAR04A	30JUL04	114	-10
1407-125	02FEB04A	30JUN04	108*	11
1407-130	02FEB04A	30JUN04	108*	11
1407-135	09JUN04*	30JUN04	16*	11
1407-202	01MAR04A	02JUL04	90*	9
1407-204	02FEB04A	30JUN04	129	11
197		30JUL04	0	-10
Coil Test Facility - Gettelfinger				
1409-027	03MAY04A	11JUN04	30*	67
1409-028	25JUN04	09JUL04	10	58
1409-040	01MAY04A	18JUN04	35*	62
1409-044	24JUN04*	24JUN04	1	58
1409-046		09JUL04	0	58
1409-120	01MAY04A	11JUN04	30*	67
1409-130	09JUN04	16JUN04	6	26
1409-135	03AUG04*	23AUG04	15	27
1409-140	09JUN04*	15JUN04	5*	27
1409-145	17JUN04	17JUN04	1	26
1409-150	18JUN04	24AUG04	47	26
1409-155	04AUG04	24AUG04	15	26
1409-160	25AUG04	02SEP04	7	26
1409-165		02SEP04	0	26
Twisted Racetrack Coil - Chrzanowski				
105	09JUN04	07JUL04	20	-13
110		07JUL04	0	-13
111	08JUL04	21JUL04	10	-13
115	08JUL04	04AUG04	20	-13
116	22JUL04	16SEP04	40	-13
117	22JUL04	16SEP04	40	-13
119	02JUL04*		0	-9
120	02JUL04	13SEP04	50	-9
121	09JUN04	21JUL04	30	-3
124		04AUG04	0	-13
109		12JUL04*	0	4
125	05AUG04	18AUG04	10	-13
126	19AUG04	16SEP04	20	-13
127	17SEP04	30SEP04	10	-13
128	01OCT04	14OCT04	10	-13
129	15OCT04	28OCT04	10	-13
130	29OCT04	04NOV04	5	-13
131	05NOV04	11NOV04	5	-13
132	12NOV04	18NOV04	5	-13
Property Testing - Chrzanowski				
600	21JUN04*	25JUN04	5	74
605	28JUN04	02JUL04	5	74
610	06JUL04	12JUL04	5	74
615	13JUL04	19JUL04	5	74
620	09JUN04	07JUL04	20	82
750	28JUN04*	12JUL04	10	7
760	13JUL04	26JUL04	10	7
770	27JUL04	09AUG04	10	7
Winding Component Design - Williamson				
1403-200	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-201	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-202	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-203	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-204	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-204A	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-205	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-206	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-207	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-208	01JUL04*	30SEP04	64*	17
1403-58C	01OCT04	07OCT04	5	17
140		18NOV04	0	-13
Production Coil Winding TYPE C) - Chrzan				
145	19NOV04	29NOV04	5	-13
150	30NOV04	05JAN05	20	-13
155	06JAN05	02MAR05	40	5
156	01OCT04	28OCT04	20	47
157	06JAN05	02FEB05	20	-13
158	06JAN05	02FEB05	20	-13
160	06JAN05	02MAR05	40	20
161	19NOV04	26JAN05	40	80
162	28OCT04	24NOV04	20	16
163		10DEC04*	0	6
165		10JAN05	0	-8
170	11JAN05	26JAN05	12	-8
175	03FEB05	28MAR05	38	-13
180	29MAR05	18APR05	15	-13
185	19APR05	04MAY05	12	-13
190	05MAY05	11MAY05	5	-13
195	12MAY05	18MAY05	5	-13
199		18MAY05	0	-13
Materials - Chrzanowski				
420	13JUL04	05OCT04	60	64
410	21JUN04	12JUL04	15	64
400	09JUN04	18JUN04	8	64
520	13JUL04	23AUG04	30	74
510	21JUN04	12JUL04	15	74
500	09JUN04	18JUN04	8	74
320	13JUL04	09AUG04	20	157
310	21JUN04	12JUL04	15	157
300	09JUN04	18JUN04	8	157
Prototype - Chrzanowski				
700		29SEP04	0	16
710	30SEP04	27OCT04	20	16
Winding Form Prototype - Heitzenroeder				
2000	13JUL04	29SEP04	56	16
2010	09JUN04	16JUL04	27	26
2020	19JUL04	15SEP04	42	26
Winding Form Production Contract - Heitze				
1000	09JUN04	25JUN04	13	-8
1010	28JUN04	02JUL04	5	-8
1020	06JUL04	02AUG04	20	-8
1030	03AUG04	30AUG04	20	-8
1040		30AUG04	0	-8
1050	31AUG04	14SEP04	10	-8
1060		14SEP04	0	-8
1065	15SEP04	12OCT04	20	-8
1070	13OCT04	23DEC04	50	-8
1071	04JAN05	10JAN05	5	-8
1072		10JAN05	0	92
1074	15SEP04	28SEP04	10	66
1075	29SEP04	12OCT04	10	66
1080	13OCT04	05NOV04	18	66
1090	22NOV04	27JAN05	40	56
1092	28JAN05	03FEB05	5	74
1091		03FEB05	0	74
1094	29SEP04	12OCT04	10	147
1095	13OCT04	26OCT04	10	74
1100	08NOV04	03DEC04	18	66
1110	20DEC04	22FEB05	40	56
1112	23FEB05	01MAR05	5	56
1111		01MAR05	0	56
Winding Form Extended Prototyping- Heitz				
3000		25JUN04	0	-8
3010	28JUN04	02JUL04	5	-8
3020	06JUL04	19JUL04	10	-8
3030	20JUL04	02AUG04	10	-8
3040	03AUG04	30AUG04	20	-8
3050	31AUG04	14SEP04	10	-8
3110	28JUN04	02JUL04	5	169
3120	06JUL04	19JUL04	10	169
3130	20JUL04	09AUG04	15	169
3140	10AUG04	07SEP04	20	169
3150	08SEP04	10SEP04	3	169

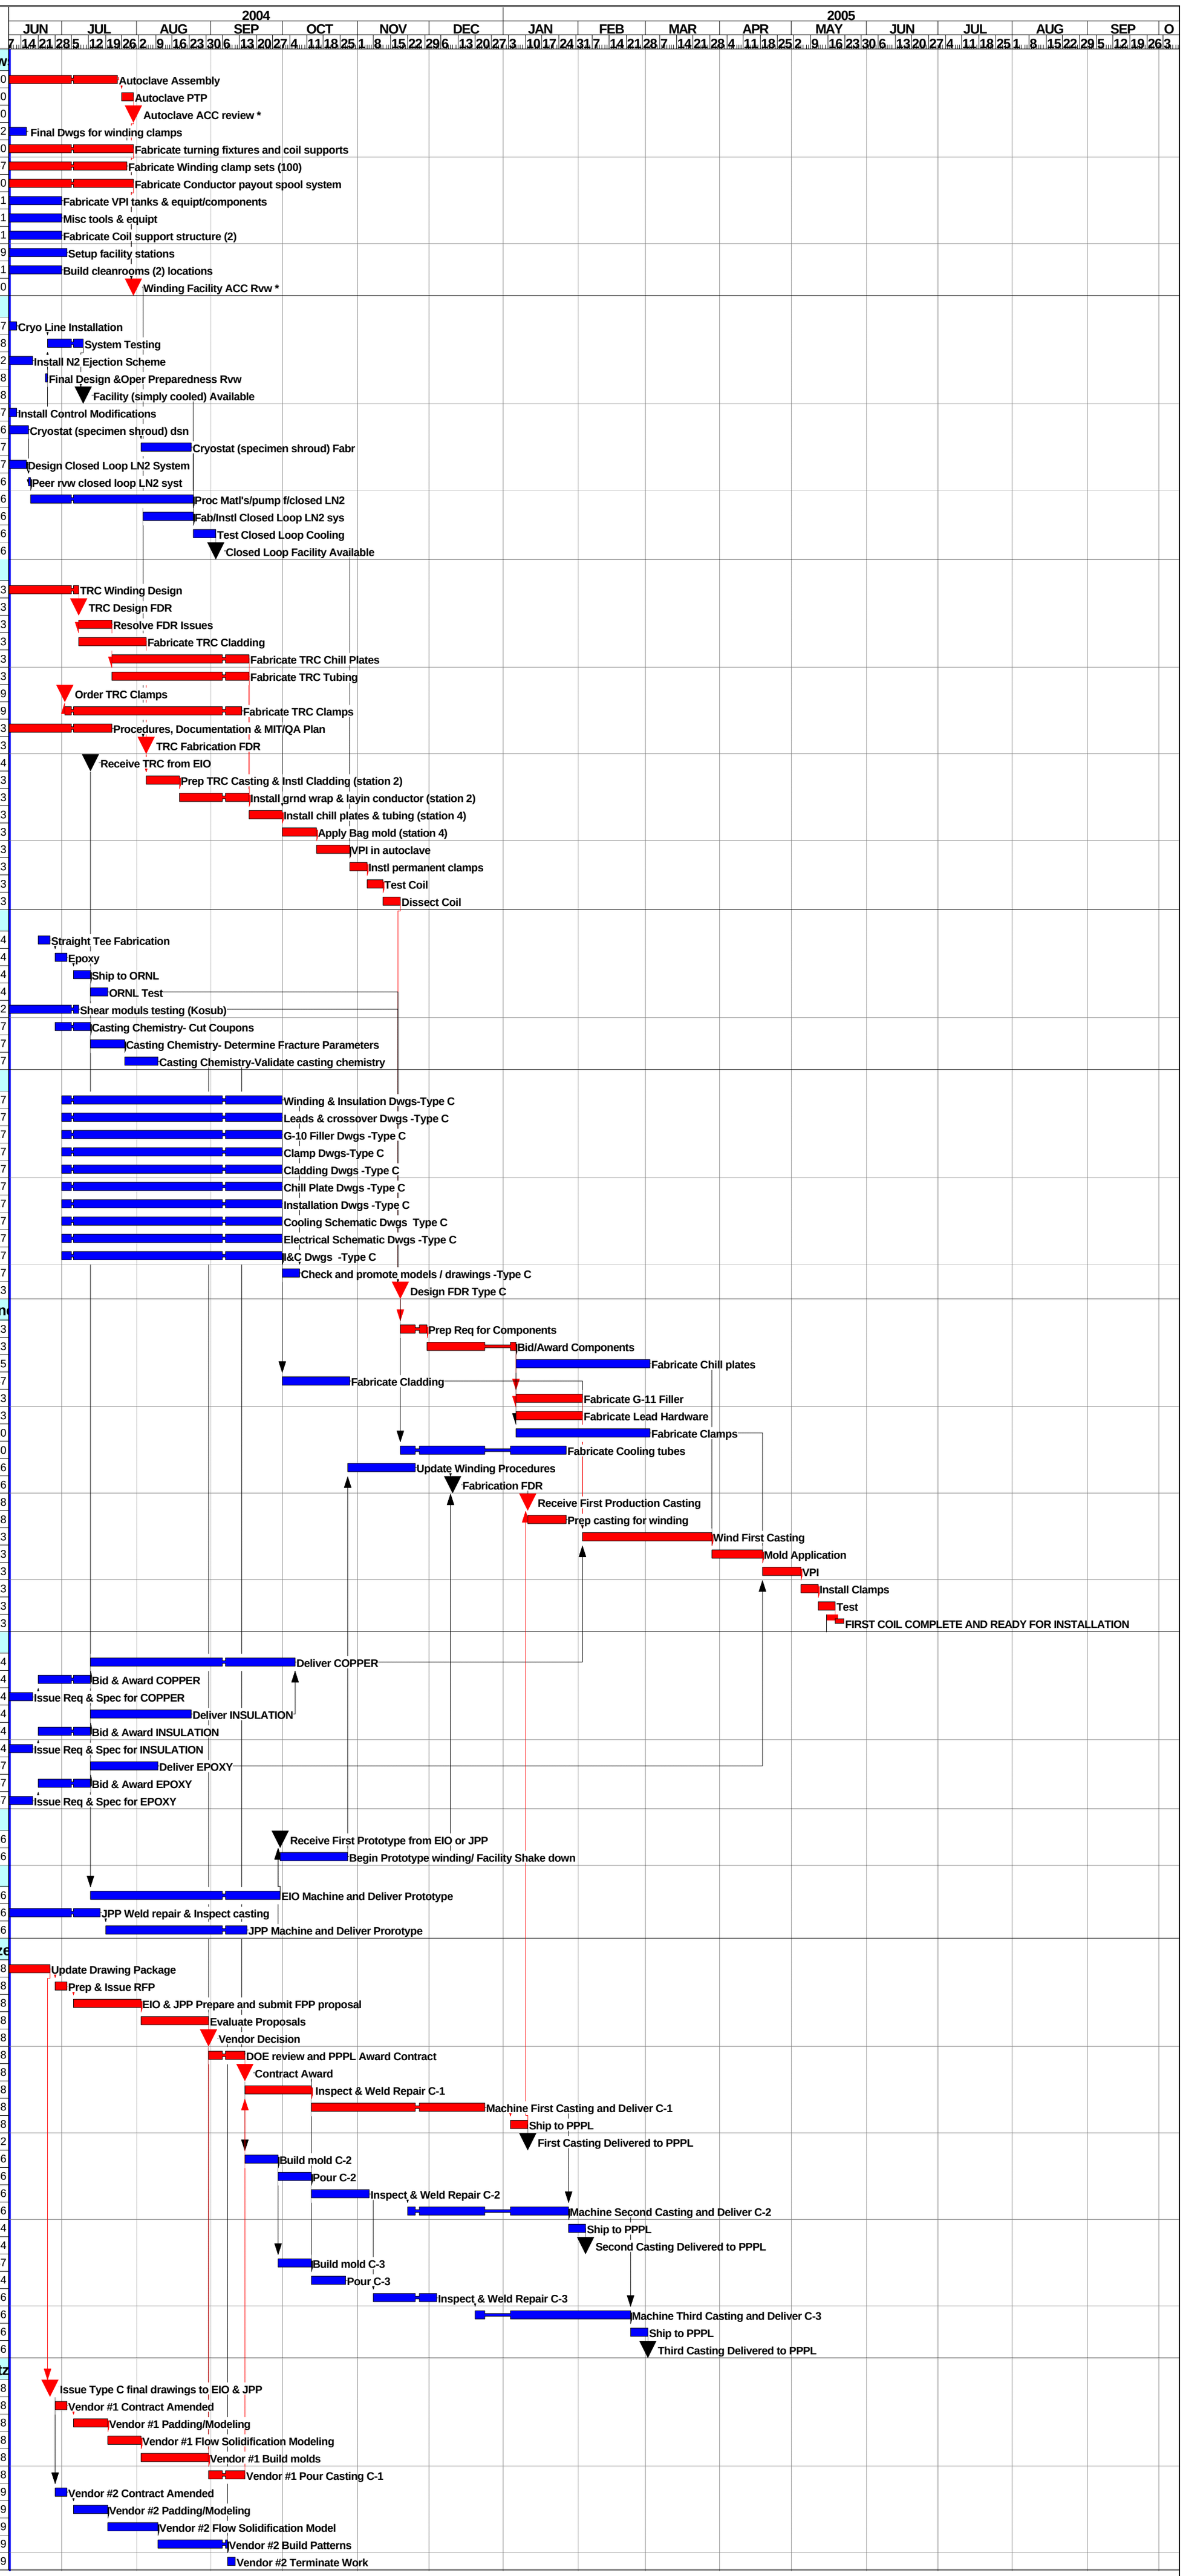

Start Date 09JUN04

© Primavera Systems, Inc.

XXXX

MC Winding Plan

Sheet 1 of 1
